

		lavoro:	scheda lavoro
	modello: T_WO_SCHEPRO Rev.1.0 del 28.06.2006	Progetto esecutivo dei lavori di sistemazione idrogeologica del torrente Vegliato in comune di Gemona del Friuli - Perizia di variante a seguito degli eventi di piena del 25-26 ottobre 1999	Torrente Vegliato, Gemona del Fr. (UD) Sistemazione Idraulico-Forestale
	0013DSL1.DOC Pagina 1 di 1		

importo opere: periodo progettazione: periodo esecuzione:

descrizione progetto: Progettazione esecutiva di interventi di sistemazione idraulico-forestale, anche con uso di tecniche di ingegneria naturalistica, lungo il torrente Vegliato e l'affluente rio Sorgive, in comune di Gemona del Friuli.

prestazione resa: progettazione esecutiva ed assistenza alla D.L. relativamente a:
1. ripristino idraulico-funzionale di una briglia in pietrame lungo il torrente Vegliato;
2. interventi di ingegneria naturalistica lungo il rio Sorgive, affluente di dx. (briglie in legname, grate vive, cordonate...);
3. sghiaiamiento di un tratto di asta del t. Vegliato sovralluvionata.


committente progetto: Comunità Montana del Gemonese – via Caneva, 25 – 33013 Gemona del Fr. (UD) – resp. dott. for. Lorenzo Beltrame

committente prestazione: Studio Tecnico ing. Mario Causero – viale Europa Unita 141 – 33100 Udine

impresa costruttrice:



**Rio Sorgive:
nuove briglie in
legname e
pietrame**

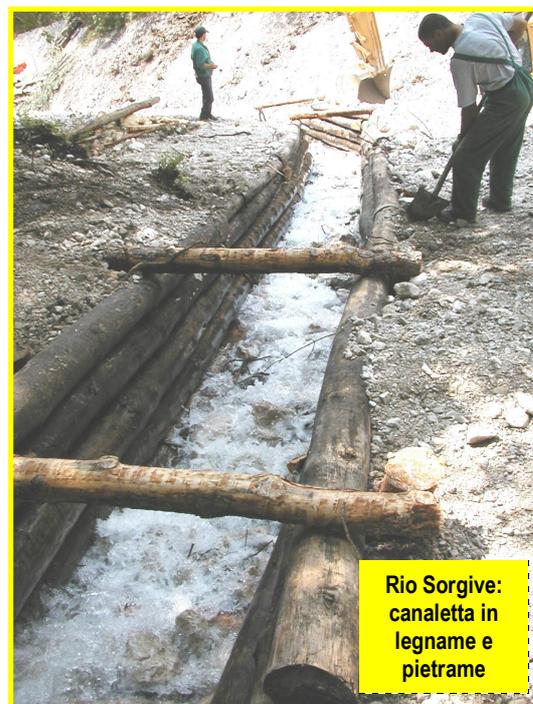

**Rio Sorgive:
canaletta in
legname e
pietrame**



**Rio Sorgive:
nuove grata
viva in
costruzione**
